

P R O T O K O L č. 160/2019
o vecnom odovzdaní a prevzatí dokončenej stavby:
„Rekonštrukcia zdroja tepla v MDPOH“ na Gorkého ulici č. 17,
v MČ Bratislava – Staré Mesto

I. Účastníci

Odovzdávajúca strana: Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
Židovská 1
815 15 Bratislava
zastúpená: Ing. Vladimír Grežo
riaditeľ

Preberajúca strana: Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava
zastúpená: Ing. arch. Matúš Vallo
primátor Hl. mesta SR Bratislavy

II. Dôvod odovzdania

Hlavné mesto SR Bratislava je výlučným vlastníkom stavby súpisné číslo 478 postavenej na pozemku v registri „C“ KN parc. č.103/3, k.ú. Staré Mesto, obec Bratislava – m.č. Staré Mesto, na liste vlastníctva č.1656.

V súlade s plnením uznesenia č.201/2019 zo dňa 27.06.2019, ktorým bola schválená zmena rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019, boli pre príspevkovú organizáciu BKIS Bratislava vyčlenené finančné prostriedky 91 000,00 Eur na stavbu **„Rekonštrukcia zdroja tepla v MDPOH“, na Gorkého ulici č.17, Bratislava.**

Zmluvné strany sa v súlade so Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy a na základe splnomocnenia Hlavného mesta SR Bratislavy dohodli na odovzdaní stavby **„Rekonštrukcia zdroja tepla v MDPOH“, na Gorkého ulici č.17, Bratislava,** ktorého realizáciu zabezpečilo Bratislavské kultúrne a informačné stredisko na základe poverenia Hlavného mesta SR Bratislava. Dodávka a montáž predmetu odovzdania sa odovzdáva do majetku Hlavnému mestu SR Bratislavy.

III. Predmet odovzdania

Predmetom odovzdania a prevzatia je dokončená stavba: **„Rekonštrukcia zdroja tepla v MDPOH“** uskutočnená v budove súpisné číslo 478 postavenej na pozemku p.č.103/3, k. ú. Staré Mesto v správe Hlavného mesta SR Bratislavy.

Miesto stavby: Bratislava, Mestská časť Bratislava – Staré Mesto
k.ú. Staré Mesto, súpisné číslo 478 na parc. č.103/3
Stavebník: Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava

Zhotoviteľ: VEMAPOS, s.r.o.
Stará Vajnorská č. 37
831 04 Bratislava
IČO: 35829613

Všetky stavebné a montážne práce boli realizované v termíne august-september/2019.

IV. Hodnota odovzdávaného a preberaného majetku

Pre účely výkonu správy sa odovzdávaný majetok rozčleňuje podľa organizačných útvarov Magistrátu hl. m. SR Bratislavy, vykonávajúcich operatívnu správu nasledovne:

Sekcia správy nehnuteľností, oddelenie nájomného bývania, správy a inventarizácie majetku,

Názov majetku	suma v Eur
Rekonštrukcia zdroja tepla	
v celkovej hodnote v €	62 993,34€
DPH 20%	12 598,67€
Spolu	75 592,04€
slovom: sedemdesiatpäťtisícpäťstodevedesiatdva eur a štyri centy	

V. Termín a dôsledky odovzdania a prevzatia

V súlade s čl. II. tohto protokolu Bratislavské Kultúrne a Informačné Stredisko vecne odovzdáva a Sekcia správy nehnuteľností, oddelenie nájomného bývania, správy a inventarizácie majetku preberá predmet odovzdania definovaný v čl. III a IV. tohto protokolu dňom podpísania protokolu poslednou zo zmluvných strán. Uvedeným dňom prechádza vlastníctvo dodaného a namontovaného predmetu odovzdania na Hlavné mesto SR Bratislavu.

Súčasne sa nadobúdacia hodnota majetku podľa čl. V. odpisuje z účtu rozostavanosti 042 odovzdávajúcej organizácie.

VI. Ostatné ustanovenia

Protokol nadobudne platnosť dňom jeho podpisu poslednou zo zmluvných strán. Protokol je povinne zverejňovanou listinou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a nadobúda účinnosť podľa ust. § 47a ods.1 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Hlavného mesta SR Bratislavy.

Tento protokol bol vyhotovený v 10-ich, slovom: desiatich rovnopisoch Hlavné mesto SR Bratislava obdrží šesť rovnopisov, Bratislavské kultúrne a informačné stredisko štyri vyhotovenia tohto protokolu.

Súčasťou vecného odovzdania a prevzatia sú doklady podľa prílohy č. 1, ktoré Bratislavské kultúrne a informačné stredisko dňom podpisu odovzdá vlastníčkovi: Hlavnému mestu SR Bratislava.

Všetky zúčastnené strany tohto protokolu súčasne prehlasujú, že si Protokol o vecnom odovzdaní a prevzatí dokončenej stavby prečítali, porozumeli jeho obsahu a súhlasia so všetkými jeho ustanoveniami, čo potvrdzujú svojím podpisom.

V Bratislave dňa 16.10.2019

V Bratislave 16.10.2019

Odovzdávajúci:

Preberajúci:

.....
Ing. Vladimír Grežo, v.r.
riaditeľ BKIS

v.z. Ing. Tatiana Kratochvílová, v.r.

.....
Ing. arch. Matúš Vallo
primátor hl. mesta SR Bratislavy

Príloha č.1

Dodávateľ: VEMAPOS, s.r.o. Stará Vajnorská 37 831 04 Bratislava IČO : 35829613 IČ DPH : SK2020215736 DIČ :		F A K T Ú R A Č Í S L O : 2019068	
Zapísané: Obchodný register Okres.súdu BA I. vložka č. 2587/B Tel : 0910909135 Fax : E-mail:		Dátum vyhotovenia dokl: 04.09.2019 Deň vzniku daňovej povinnosti 04.09.2019 Dátum splatnosti: 27.09.2019	
		Odberateľ: 854 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko Židovská 1 815 15 Bratislava IČO : 30794544 IČ DPH: SK2021795358 DIČ:	
Var. symbol: 2019068			
Banka : Tatra banka Bratislava		Číslo účtu: 2625431643/1100 Mena Swift: EUR TATRSKBX IBAN: SK14 1100 0000 0026 2543 1643	
Názov	Množstvo	Cena/jedn	Suma DPH %

Na základe ZoD č.: 160/2019 zo dňa 24.7.2019 Vám faktúrujeme za práce
 Rekonštrukcia zdroja tepla Mestské divadlo P.O.Hviezdoslava Gorkého 17, BA
 vrátane dodávky materiálu sumu:

	1.00	62993.34 EUR	62993.34	0.00
Suma bez DPH			62993.34 EUR	
	0.00	62993.34 EUR	0.00 EUR	
DPH celkovo			0.00 EUR	
Suma			62993.34 EUR	

Prenos daňovej povinnosti.

Vyhotovil: Habrman

VEMAPOS, s.r.o.
 Stará Vajnorská 37
 831 04 Bratislava
 IČO: 35829613
 IČ DPH: SK2020215736

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko Židovská 1, 815 15 BRATISLAVA	
Dátum dokl: 04.09.2019	
Podpis: <i>1971</i>	IČO: <i>EF21</i>
V. Habrman: <i>PRC</i>	IČO: <i>10</i>

Krycí list súpisu prác

Stavba: Rekonštrukcia zdroja tepla v MDPOH BA Gorkého ul. 17

Objekt: 01 - Rekonštrukcia zdroja tepla

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko Židovská 1, 815 15 Bratislava

Zhotoviteľ:

VEMAPOS, s.r.o. Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 04.09.2019

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

62 993,34

0,00

Cena bez DPH

62 993,34

DPH základná

20,00%

z

0,00

znižená

20,00%

z

62 993,34

0,00

12 598,67

Cena s DPH

v EUR

75 592,01

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

VEMAPOS, s.r.o.

Stará Vaj

831 04 B

IČO: 35 829 613

IČ DPH: SK2020215736

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Rekapitulácia súpisu prác

Stavba: Rekonštrukcia zdroja tepla v MDPOH BA Gorkého ul. 17

Objekt: 01 - Rekonštrukcia zdroja tepla

Miesto:

Dátum:

04.09.2019

Objednávateľ:

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko Židov

Zhotoviteľ:

VEMAPOS, s.r.o. Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

62 993,34

PSV - Práce a dodávky PSV

60 240,29

713 - Izolácie tepelné

736,76

723 - Zdravotechnika - plynovod

601,60

731 - Ústredné kúrenie, kotolne-demontáž

45 118,35

732 - Ústredné kúrenie, strojovne

4 421,46

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

1 810,30

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

6 601,06

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

823,67

783 - Dokončovacie práce - nátery

127,10

M - Práce a dodávky M

2 753,05

23-M - Montáže potrubia

197,05

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

936,00

OST - Ostatné

1 620,00

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

62 993,34

VEMAPOS, s.r.o.

Stará Vajnorská 37

831 04 Bratislava

IČO:

IČ DPH: SK2020215736

Súpis prác

Stavba:

Rekonštrukcia zdroja tepla v MDPOH BA Gorkého ul. 17

Objekt:

01 - Rekonštrukcia zdroja tepla

Miesto:

Dátum:

04.09.2019

Objednávateľ:

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko Židovského Projektant:

Zhotoviteľ:

HEMAPOS, s.r.o. Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava Spracovateľ:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množstvo

J.cena [EUR]

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

62993,34

PSV - Práce a dodávky PSV

60240,29

713 - Izolácie tepelné

1	K	713300842	Odstránenie tepelnej izolácie telies z vlákňitých mater. z konštr. vrátane povrchové úpravy, - 0,05250t	m2	30,00	11,24	337,17
2	M	N 89/15	Izolačná PE trubica POLIFOAM. 89x15 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, HELORO	m	24,00	5,53	132,72
3	M	N 8109/15	Izolačná PE trubica POLIFOAM. 109x15 mm (d x hr. izolácie), dl. 2 m, HELORO	m	18,00	6,50	117,00
4	K	713482123	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 71-95 mm	m	24,00	3,14	75,46
5	K	713482124	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priem. 96-133 mm	m	18,00	3,43	61,74
6	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	7,24	1,30	9,41
7	K	998713293	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	7,24	0,45	3,26

723 - Zdravotechnika - plynovod

601,60

8	K	723120202	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 15	m	18,00	9,26	166,63
9	K	723120205	Potrubie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 32	m	10,00	12,47	124,71
10	K	723120205a	Zaslepenie plynového potrubia DN40	ks	1,00	30,00	30,00
11	K	723120805	Demontáž potrubia zvarovaného z ocelových rúrok závitových nad 25 do DN 50, -0,00342t	m	4,00	2,45	9,78
12	K	723190205	Prípojka plynovodná z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 32	súb.	2,00	67,14	134,27
13	K	723229102	Montáž armatúry závit. s jedným závitom, kohútik hadicový a iné plynovodné armatúry G 1/2	súb.	8,00	2,95	23,56
14	K	723239104	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy, solenoidový ventil G 5/4	ks	4,00	4,36	17,43
15	M	5516050030	Kohút guľový plyn 5/4"FF, páka	ks	2,00	19,26	38,51
16	M	5516050005	Kohút guľový plyn 1/2"MF, páka	ks	4,00	4,89	19,58
17	M	5516050005a	Kohút vzorkovací plyn 1/2"MF, páka	ks	2,00	6,50	13,00
18	M	3199661985	Šraubenie 5/4" FF	ks	2,00	4,29	8,58
19	M	3199661970	Šraubenie 1/2" FF	ks	2,00	1,88	3,76
20	K	998723203	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	5,90	1,00	5,90
21	K	998723293	Plynovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	5,90	1,00	5,90

731 - Ústredné kúrenie, kotolne-demontáž

45118,35

22	K	731201823	Demontáž kotla s výkonom nad 465 do 730 kW, 6,58500t	ks	1,00	676,81	676,81
23	K	731202840	Rozrezanie demontovaného kotla ocelového s hmotnosťou nad 2500 do 4000 kg	ks	1,00	481,77	481,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	731391815	Vypúšťanie vody z kotla do kanalizácie samospádom o v. pl.kotla nad 50 do 100 m2	ks	1,00	30,64	30,64
25	K	731391815a	Vynosenie kotlových častí z 5. poschodia na prízemie	ks	1,00	500,00	500,00
26	K	732420816	Demontáž kotlových čerpadiel prírubových	ks	1,00	38,20	38,20
27	K	731161025	Montáž plynového kotla stacionárneho kondenzačného 301-400 kW	ks	2,00	2000,00	4000,00
28	K	731161025a	Skladanie kotlov na mieste	ks	2,00	200,00	400,00
29	K	731161025b	Vynosenie kotlových telies na 5.poschodie	ks	2,00	300,00	600,00
30	M	bud101	kotel Logano plus KB 372-300L	ks	1,00	11375,00	11375,00
31	M	bud102	kotel Logano plus KB 372-300P	ks	1,00	11375,00	11375,00
32	M	bud103	poistná sada KSS pre 150-300 4-6 byr	ks	2,00	393,00	786,00
33	M	bud104	prípojovacia sada pre ASS 1 1/4"	ks	2,00	46,00	92,00
34	M	bud105	plynový filter pre 300 kW	ks	2,00	141,00	282,00
35	M	bud106	regulátor tlaku plynu FR5515	ks	2,00	445,00	890,00
36	M	bud107	Elektroinštalácia	ks	1,00	500,00	500,00
37	K	732222120	Montáž doskového výmenníka tepla	ks	1,00	268,27	268,27
38	M	bud108	sada výmenníka tepla DN80	ks	1,00	5990,00	5990,00
39	M	bud109	základná kaskádová sada DN200/250	ks	1,00	1180,00	1180,00
40	K	732222120A	MaR	ks	1,00	2100,00	2100,00
41	M	bud110	Logamatic MC110	ks	2,00	310,00	620,00
42	M	bud111	Logamatic BC30E	ks	2,00	133,00	266,00
43	M	bud112	Logamatic RC310 biely s FA snímačom	ks	1,00	168,00	168,00
44	M	bud113	Modul MC400	ks	1,00	303,00	303,00
45	K	998731202	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	%	457,43	3,75	1715,37
46	K	998731293	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	457,43	1,05	480,30
732 - Ústredné kúrenie, strojovne							
47	K	732199100	Montáž orientačného štitka	súb.	10,00	1,99	4421,46
48	M	5489511000	Štitky na označenie potrubia podľa STN 13 0072 s nápisom:	ks	10,00	2,39	23,87
49	K	732331015	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 50 l	ks	2,00	27,46	54,92
50	M	4846715000	Nádoba-expanzná tlak 3 bary s membránou 50 l REFLEX	ks	2,00	78,90	157,80
51	K	732331015a	Montáž MK ventil 1"	ks	2,00	15,00	30,00
52	M	4846715000a	MK ventil 1" reflex	ks	2,00	0,00	0,00
53	K	732491060	Montáž čerpadla obehového	ks	1,00	20,54	20,54
54	M	4268155780b	Obehové čerpadlo GRUNDFOS MAGNA	ks	1,00	2450,00	2450,00
55	K	732491060a	Montáž úpravne vody	ks	1,00	250,00	250,00
56	M	up501	Úpravňa vody	ks	1,00	0,00	0,00
57	K	732491060b	Montáž dymovodu	ks	1,00	200,00	200,00
58	M	kom502	Uvedenie úpravne do prevádzky	ks	1,00	60,00	60,00
59	K	732491060c	Vložkovanie komína	ks	1,00	400,00	400,00
60	M	kom503	Kominová vložka 8m	ks	1,00	750,00	750,00
61	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	2,87	1,10	3,15
62	K	998732293	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	2,87	0,45	1,29
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie							
63	K	733110803	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových do DN 15, -0,00100t	m	18,00	0,71	12,78
64	K	733110810	Demontáž potrubia z ocelových rúrok závitových nad 50 do DN 80, -0,00858t	m	10,00	1,76	17,59
65	K	733120832	Demontáž potrubia z ocelových rúrok hladkých nad 89 do D 133, -0,01384t	m	18,00	2,72	49,03
66	K	733121125	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 89/3,6	m	24,00	35,71	856,97
67	K	733121128	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 108/4,0	m	18,00	44,66	803,79
68	K	733190217	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok do priem. 89/5	m	24,00	0,39	9,34

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
69	K	733190232	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok nad 89/5 do priem. 133/5, 0	m	18,00	0,65	11,63
70	K	733193820	Rozrezanie konzoly, podpory a výložníka pre potrubie z uholníkov L nad 50x50x5 do 80x80x8 mm, -0,00747t	ks	30,00	0,40	11,94
71	K	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	17,73	1,50	26,60
72	K	998733293	Rozvody potrubia, pripl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	17,73	0,60	10,64
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.							
73	K	734100812	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami nad 50 do DN 100, -0,03900t	ks	5,00	9,00	6601,06
74	K	734109216	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1, 6 DN 80	súb.	6,00	66,56	45,01
75	M	551KL80	Medziprírubová klapka Ebro Z14 DN80 voda	ks	4,00	122,20	399,35
76	M	551KL80p	Medziprírubová klapka s pohonom DN80	ks	2,00	1934,00	488,80
77	M	3194620900	Príruba plochá privarovacia DN 80 PN16, 80/88,9 EN 1092-1, DIN 2573	ks	18,00	13,40	3868,00
78	M	3194620900a	Príruby k doskovému výmenníku	ks	4,00	12,40	241,20
79	K	734173417	Prírubový spoj PN 1, 6/I, 200st. C DN 80	súb.	13,00	21,50	49,61
80	K	734213250	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	4,00	2,13	279,50
81	M	33464	Flexvent H 1/2"	ks	4,00	18,10	8,54
82	K	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	2,00	4,37	72,40
83	M	4849210151	Poistný ventil pre vykurovanie, 5/4" x 6/4", KDDN 32, mosadz OT 58 IVAR	ks	2,00	287,59	8,74
84	K	734411111	Teplomer technický s ochranným púzdom - priamy typ 160 prev."A"	ks	4,00	15,94	575,17
85	K	734412130	Montáž teplomeru technického axiálneho priemer 63 mm dĺžka 100 mm	ks	4,00	12,69	63,77
86	K	734421130	Tlakomer deformačný kruhový c.03313 priem. 160	ks	4,00	45,33	50,75
87	K	734424120	Montáž tlakomera	ks	4,00	27,23	181,32
88	M	4227263000	Slučka kondenzátu otočná PN 250, s čapom M 20x1,5 mm	ks	4,00	13,50	108,90
89	K	734424912	Kohútik čapový K 70-181-716 M 20 x 1, 5	ks	4,00	16,33	54,00
90	K	734494213	Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom akost' mat. 22 353.0 G 1/2	ks	4,00	5,55	65,33
91	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	26,37	0,25	22,21
92	K	998734293	Armatúry, pripl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	26,37	0,45	6,59
767 - Konštrukcie doplnkové kovové							
93	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	50,00	6,33	823,67
94	M	kdk101	ocelové konštrukcie materiál	kg	50,00	3,50	316,25
95	M	kdk102	konzola pod doskový výmenník	sub	1,00	250,00	175,00
96	K	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	50,00	1,41	250,00
97	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	8,12	0,90	70,65
98	K	998767293	Kovové stav.doplň.konstr., pripl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	%	8,12	0,55	7,31
783 - Dokončovacie práce - nátery							
99	K	783424140	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	m	18,00	1,38	127,10
100	K	783424740	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm základné - 35µm	m	18,00	0,54	24,82
							9,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
101	K	783425150	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnásobné so základným náterom - 105µm	m	42,00	1,71	71,95
102	K	783425750	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm základné - 35µm	m	42,00	0,49	20,66
M - Práce a dodávky M							2753,05
23-M - Montáže potrubia							197,05
103	K	230120041	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 32	m	18,00	1,44	25,97
104	K	230120042	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 40	m	10,00	1,70	16,95
105	K	230170001	Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40	úsek	1,00	91,71	91,71
106	K	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	28,00	2,23	62,41
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby							936,00
107	K	HZS101	Vykurovacia skúška	hod	72,00	13,00	936,00
OST - Ostatné							1620,00
108	K	OST003	revízie a revízne správy tlak	sub	1,00	200,00	200,00
109	K	OST010	Revízna kniha	ks	1,00	150,00	150,00
110	K	OST027	Revízia komína	sub	1,00	70,00	70,00
111	K	OST028	Jednoduchá projektová dokumentácia	sub	1,00	1000,00	1000,00
112	K	OST029	Revízie a revízne správy plyn	sub	1,00	200,00	200,00
113	K	OST030		sub	1,00	0,00	0,00

VEMAIPOS, s.r.o.

Stará Vajnorská 37

831 04

IČO: 35 880 619

IČ DPH: / / 36

Protokol o konečnom prevzatí diela

VEMAPOS s.r.o.
Stará Vajnorská 37
831 04 BRATISLAVA

Akcia : Rekonštrukcia zdroja tepla v MDPOH, BA
Objekt : BKIS, MDPOH, Gorkého 17, Bratislava

Objednávateľ : BKIS, Židovská 1, 815 15, Bratislava
Dodávateľ : VEMAPOS s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04, Bratislava

Miesto montáže : Kotelňa MDPOH, Gorkého 17, BA
Termín zahájenia : 26.8.2019
Termín ukončenia prác : 4.9.2019

A/ Preberacie konanie
Zástupca objednávateľa : p. Klinková
Zástupca zhotoviteľa : p. Habrman
Zástupca dodávateľa : p. Habrman

B/ Priebeh montážnych prác
Začatie prác 26.8. 2019 Demontáž Kotlov, vypratanie, stavebné práce v kotolni, vynesenie kotlov a ich rozmiestnenie na miesto inštalácie, montáž kotlov a potrubí, izolácie, montáž elektrického pripojenia kotlov a regulácie, oživenie zariadení a uvedenie do prevádzky, vykurovací skúška, revízie VTZ ukončenie a odovzdanie diela 4.9. 2019

C/ Závady
/názov obvodu - príčina - kto ju odstráni - termín/
v priložených dokumentoch

D/ Odovzdaná dokumentácia
Záručné listy kotlov Buderus K1, K2, technológie Buderus, Expanzomatu, snímačov a ostatných komponentov
Projektová dokumentácia Kúrenie , revízne správy VTZ Plynové a tlakové, revízia komína, Pasport TNS
Výpis zo zoznamu hospodárskych subjektov, oprávnenie, Faktúra so súpisom prác

Na základe prevzatia urobeného týmto protokolom objednávateľ prehlasuje, že preberá dnešným dňom predmet diela od zhotoviteľa.

dňa 4.9.2019

Za objednávateľa

p. Klinková
meno, podpis

Za zhotoviteľa
VEMAPOS, s.r.o.
Stará Vajnorská 37
831 04
IČO: 35 829 613
IČ DPH: SK2020215736
p. Habrman
meno, podpis

Za dodávateľa
VEMAPOS, s.r.o.
Stará Vajnorská 37
831 04 B
IČO: 35 829 613
IČ DPH: SK2020215736
p. Habrman
meno, podpis

Návod na obsluhu pre prevádzkovateľa


Plynový kondenzačný kotol

Logano plus

KB372-75...300

Buderus


Pred obsluhou zariadenia si prosím pozorne prečítajte.

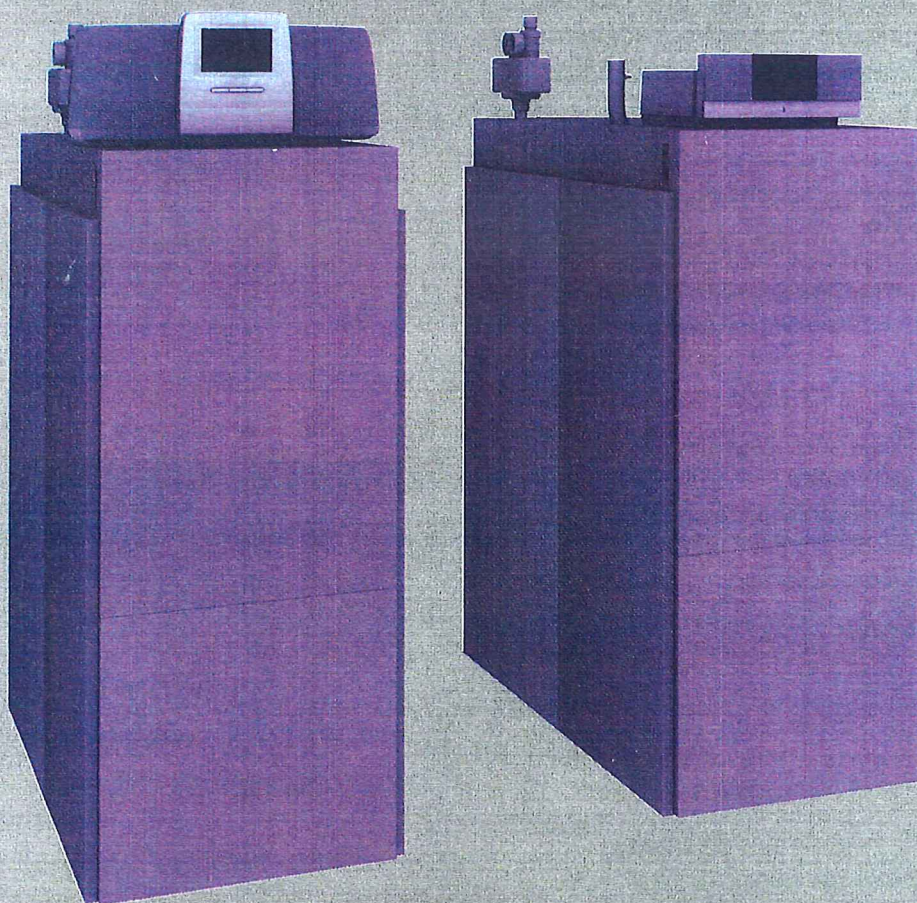

Regulátor

Logamatic MC110


Buderus

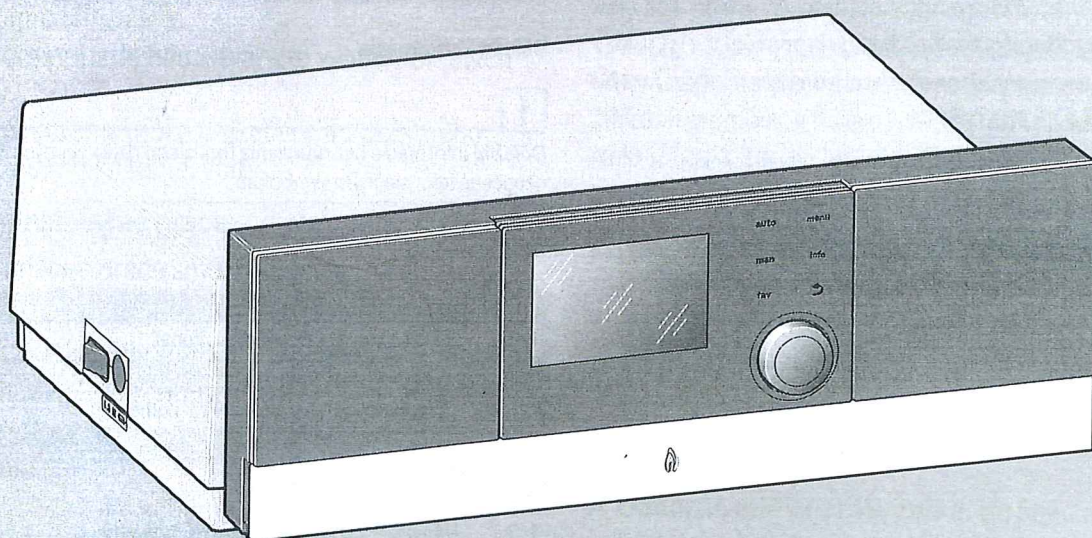

Pred obsluhou zariadenia si prosím pozorne prečítajte.



CE/EAC

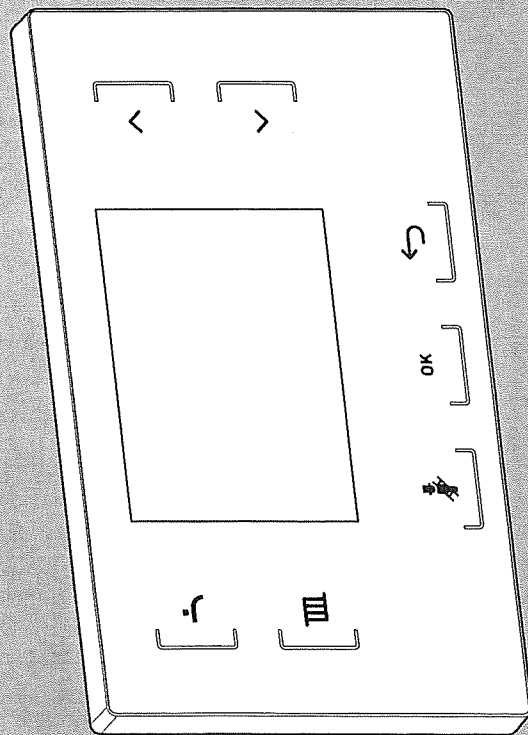

EMS plus

Buderus

Ovládacia jednotka
BC30 E


Návod na obsluhu

6 720 813 402 (2014/10)


System- Chimney

Installation instructions

CE 0036 CPD 9169 003

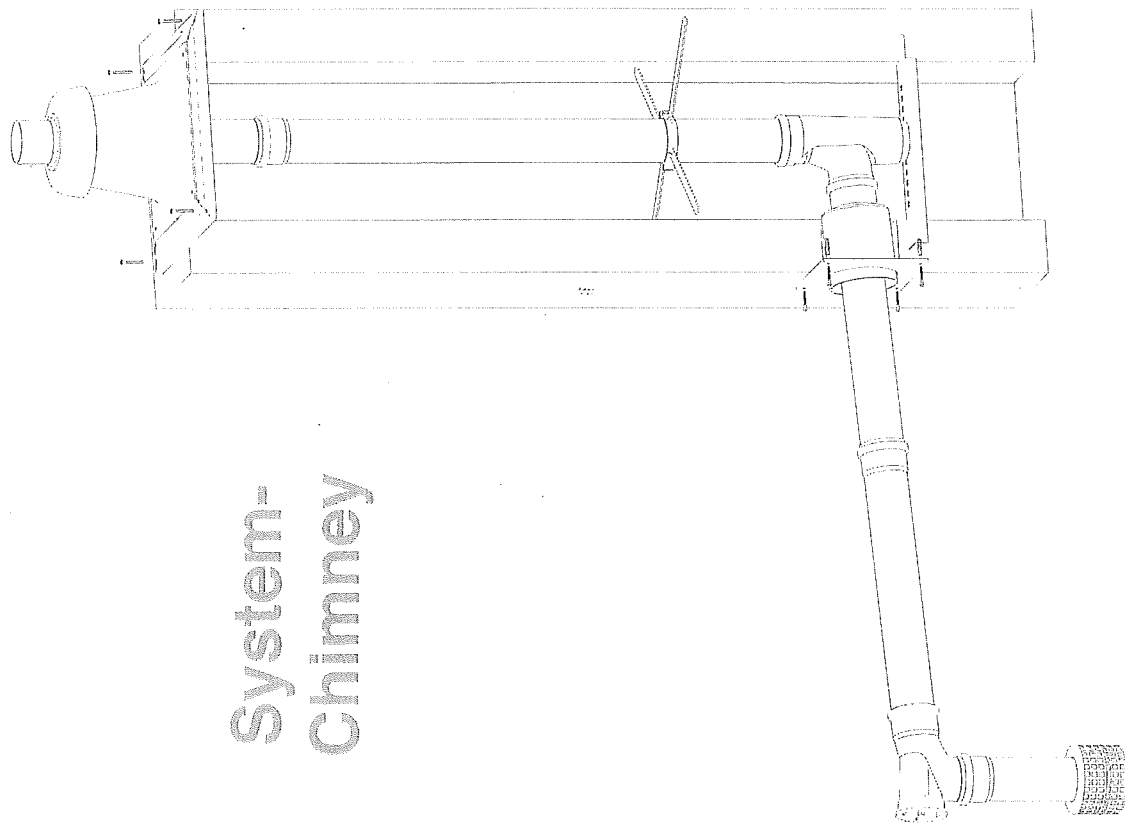

NÁVOD PRO MONTÁŽ A ÚDRŽBU



PLYNOVÉ FILTRY PN 6


FO 20 F-Z, FO 25 F-Z, FO 32 F-Z, FO 40 F-Z, FO 50 F-Z,
FO 50 F-K, FO 80 F, FO 100 F

PLYNOVÉ FILTRY PN 4

FO 150 F, FO 200 F


PLYNOVÉ FILTRY PN 16

FT 50, FT 80

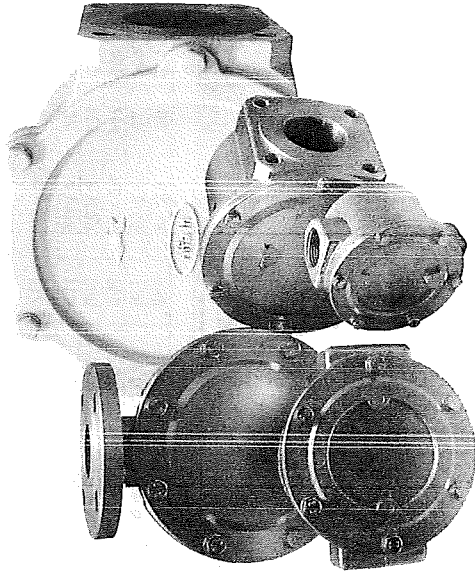

DOKUMENTÁCIA K POISTNÝM VENTILOM

D U C O

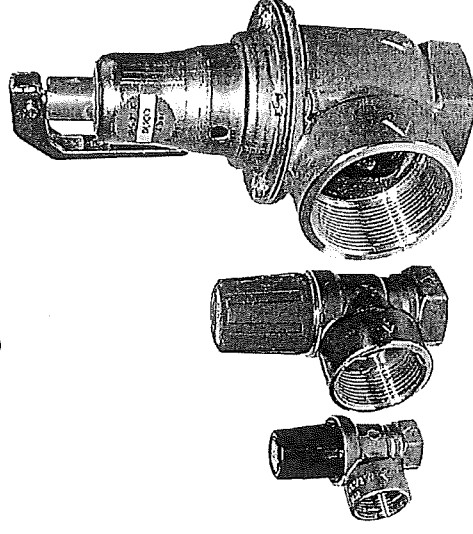


Decon, spol. s r.o., Dolné Rudiny 31, 010 91 Žilina

MAGNA3

TOUR D'HORIZON DES
MENUS À L'ÉCRAN

À partir du
modèle C

FR / IT / ES

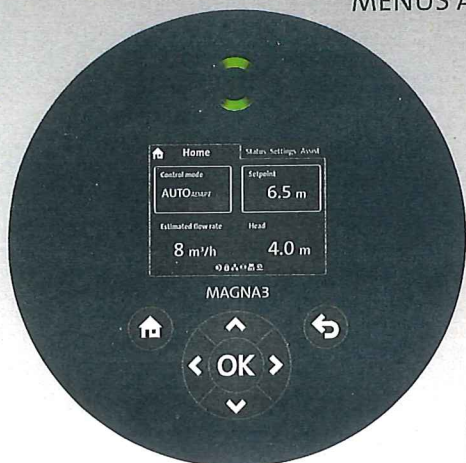

Attacher
sur le câble



be
think
innovate

GRUNDFOS


GRUNDFOS INSTRUCTIONS

MAGNA3

Further product
documentation



net.grundfos.com/qr/i/98091805

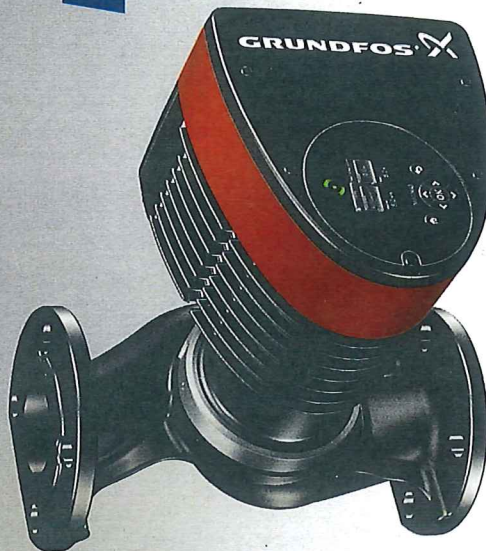

be
think
innovate

GRUNDFOS

GRUNDFOS INSTRUCTIONS

MAGNA3

Safety instructions and other important information



Installation and operating instructions


<http://net.grundfos.com/qr/i/98091805>

be
think
innovate

GRUNDFOS

reflex

Thinking solutions.

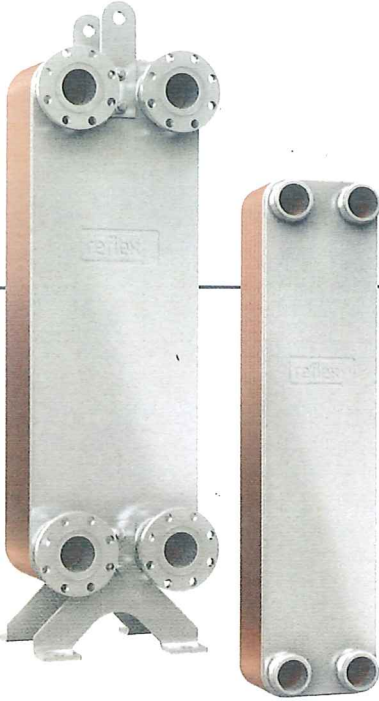

INSTRUCTION MANUAL

Brazed Plate Heat Exchangers
